

Milano



# Scuola Primaria M.L. King

Milano, Piazza Santa Maria Nascente 30 – Municipio 8



**Anna Scavuzzo, Vice Sindaco e Assessore all'Istruzione**  
**21 febbraio 2024 | Commissione Consiliare**

# Chiusura scuola Primaria M.L. King

Milano



Lunedì 25 settembre 2023 all'apertura della scuola viene rilevato in un'aula il distacco di una porzione del controsoffitto

La Dirigente Scolastica interdice l'accesso agli alunni, i VV.F. sospendono l'attività scolastica e richiedendo agli uffici dell'Area Tecnica del Comune una verifica circa la agibilità dell'edificio.

L'edificio che ospita la scuola Primaria M. L. King è già all'attenzione dell'Area Tecnica Scuole e già oggetto di rilievi e monitoraggi, essendo in attesa dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria: alcune zone più critiche soggette a infiltrazioni di acqua in passato erano state già rilevate e interessate da interventi di puntellamento e di manutenzione ordinaria utili a garantirne la sicurezza.

Nell'aula interessata dal crollo non erano invece ancora mai state rilevate tracce di infiltrazioni: evidentemente l'intensità e il ripetersi di importanti eventi meteorologici negli ultimi mesi (luglio, agosto e settembre) ha peggiorato la situazione complessiva.

# Spostamento temporaneo nella Primaria L. Cadorna - Via Dolci 5


Milano



Per garantire la ripresa immediata dell'attività didattica è stata trovata la soluzione per tutte e 11 le classi, che sono state trasferite nel plesso di via Dolci 5.

Appartiene allo stesso ICS Cadorna e ha lo spazio sufficiente per svolgere tutte le attività:

- classi per tutte le sezioni
- palestra
- laboratori
- refettorio

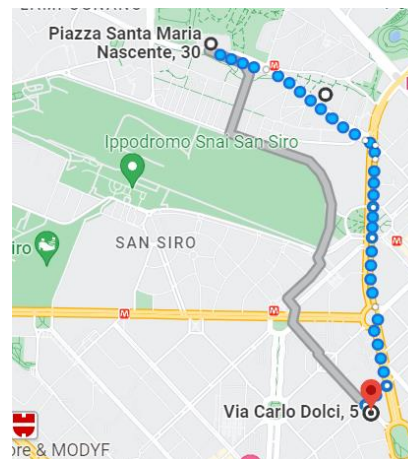

# Le navette per gli alunni

Milano



Il Comune ha messo a disposizione **150 posti su 3 bus** sia all'andata che al ritorno.

Il servizio è iniziato il **6.11.2023**

**Accoglie 120 bambini all'andata e 113 bambini al ritorno.**

È così strutturato:

- alle 7.45 partono 2 bus con un totale di 45 bambini
- alle 8.15 partono 3 bus con 75 bambini
- alle 16.30 3 bus con 76 bambini
- alle 17.00 2 bus per 37 alunni

**Tutte le famiglie che hanno chiesto il servizio sono state accettate**



# Scuola Primaria M.L. King

Milano

## Gli interventi previsti



- L'intervento di manutenzione straordinaria della copertura **era già programmato nell'accordo quadro n. 13/2022**, appalto integrato con progettazione esecutiva a carico dell'impresa aggiudicataria delle opere
- In data **08/11/2023** è stato emesso il **contratto applicativo per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento**, con termine per la redazione del progetto fissato per la prima metà di marzo 2024 (4 mesi dall'ordine)
- In data **15/11/2023** si è tenuto un **primo incontro informale con la Soprintendenza** finalizzato a verificare la compatibilità dell'intervento con il vincolo paesaggistico esistente
- Nel frattempo è stata eseguita una **campagna di indagini sulle strutture**, anche tramite prove distruttive, i cui esiti sono stati riportati in apposita relazione consegnata in data 18/01/2024
- Nelle date del **23/01/2024, 01/02/2024, 05/02/2024, 14/02/2024 e 15/02/2024**, sono stati eseguiti ulteriori **approfondimenti** tramite sopralluoghi ed incontri in contraddittorio con l'impresa, anche con il supporto di MM SPA, finalizzati **a verificare la necessità di interventi adeguamento strutturale** (cioè non limitati solo al ripristino della copertura)

## Gli interventi previsti



- In esito a detti approfondimenti, è stato **ordinato all'impresa di eseguire ulteriori specifiche indagini consistenti in prove di carico sui solai e carotaggi**; inoltre, è stata ordinata tramite altro accordo quadro dell'Area Tecnica Scuole un'indagine aggiornata sullo stato dei solai relativa al rischio di sfondellamento
- Tutti gli approfondimenti di cui sopra sono finalizzati alla redazione di un progetto di ripristino della copertura che **NON** preveda la variazione dei carichi esistenti e consistente sinteticamente in **riprofilatura dei pluviali, posa di nuova impermeabilizzazione, sigillatura dei serramenti, ripristino dei controsoffitti e interventi sulla rete di smaltimento delle acque meteoriche**
- I prossimi passaggi propedeutici all'avvio dei lavori consistono nell'esecuzione delle **indagini di approfondimento**, nella presentazione dell'**istanza di autorizzazione paesaggistica** alla Soprintendenza (corredata dai prescritti elaborati progettuali) e nell'approvazione del progetto esecutivo
